

第10回名古屋都市計画事業
新清洲駅北土地区画整理審議会

令和4年9月9日
清須市

報告事項

(1) 事業の進捗状況について


(2) 仮換地指定について

第5回、第6回、第7回使用収益開始


(3) 令和4年度の工事概要について

(1) 事業の進捗状況について

事業スケジュール

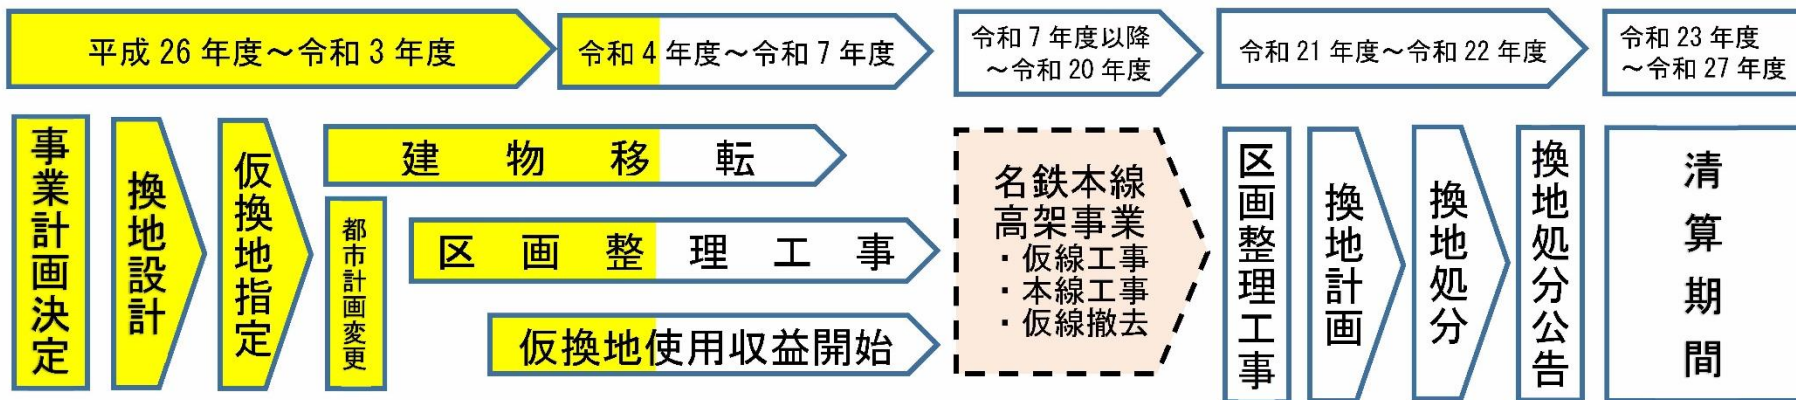


移転計画図

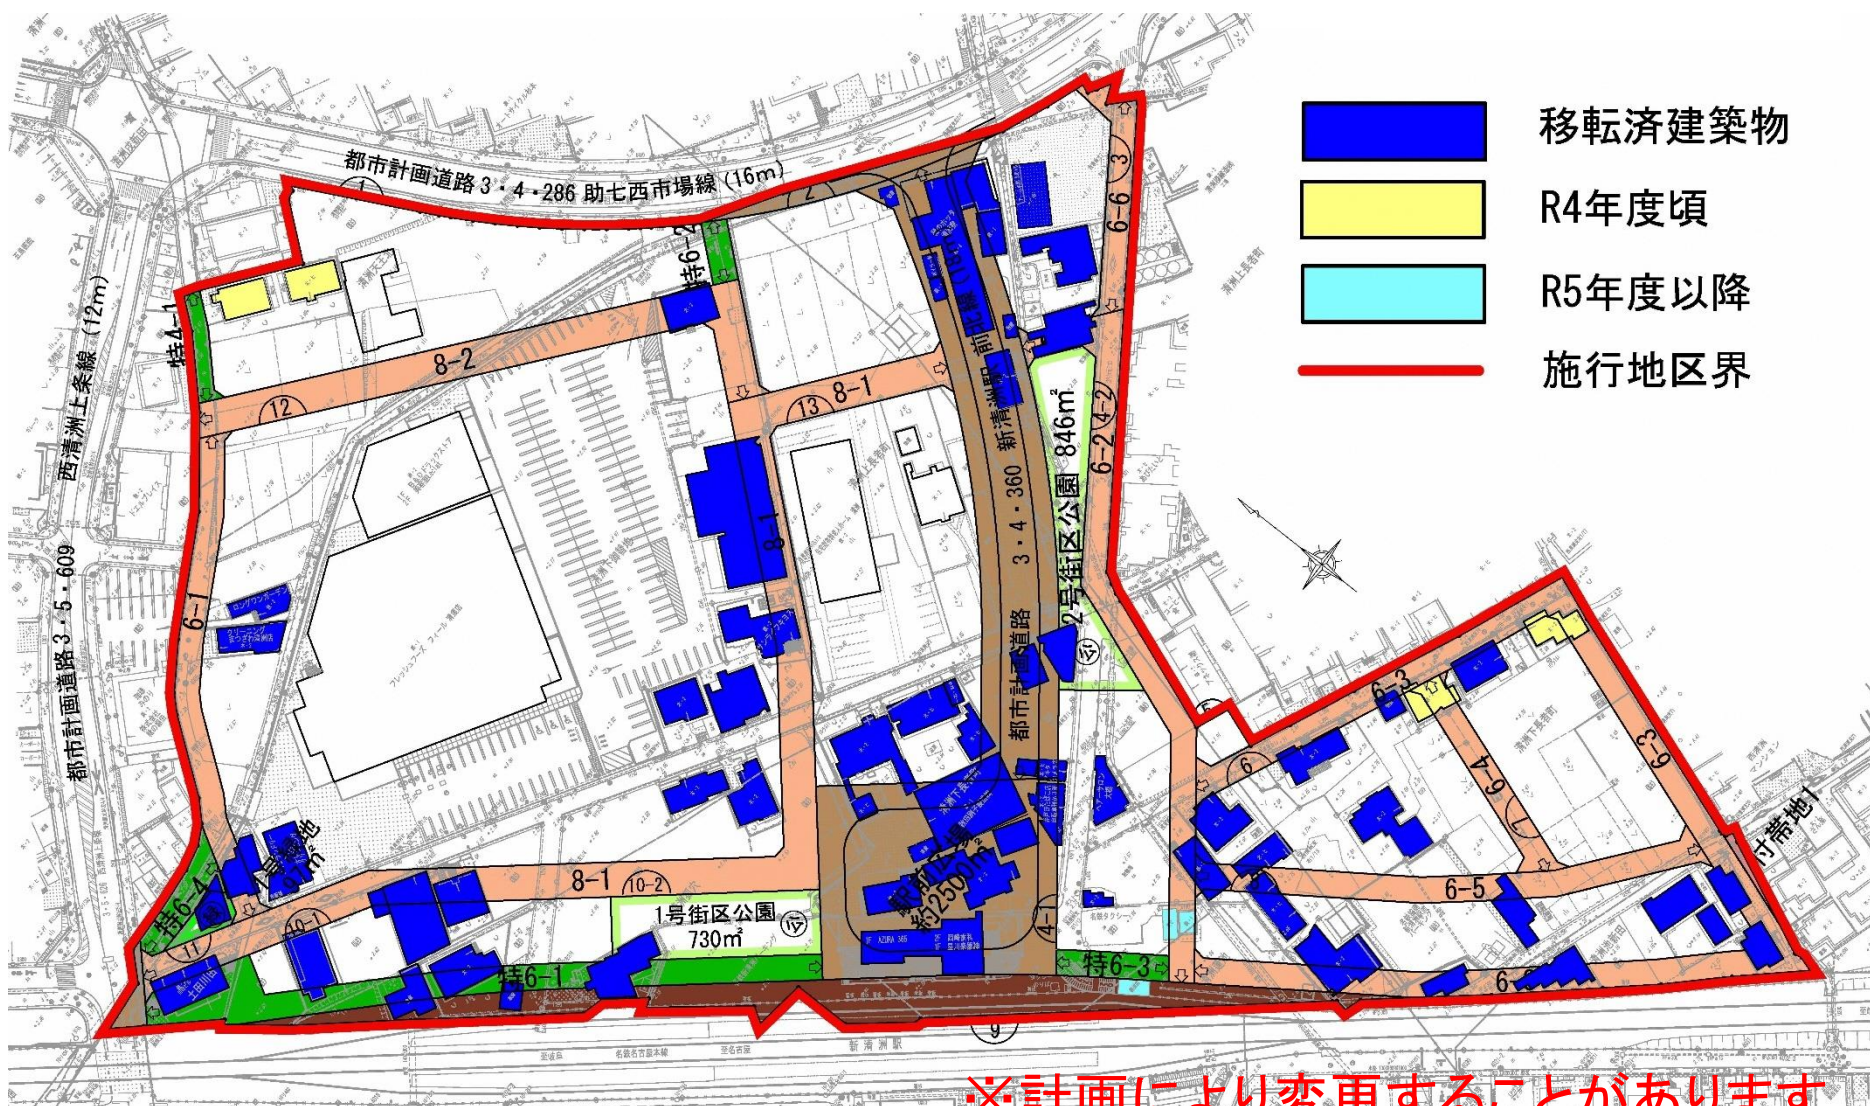


※計画により変更することがあります

宅地整備完成予定図

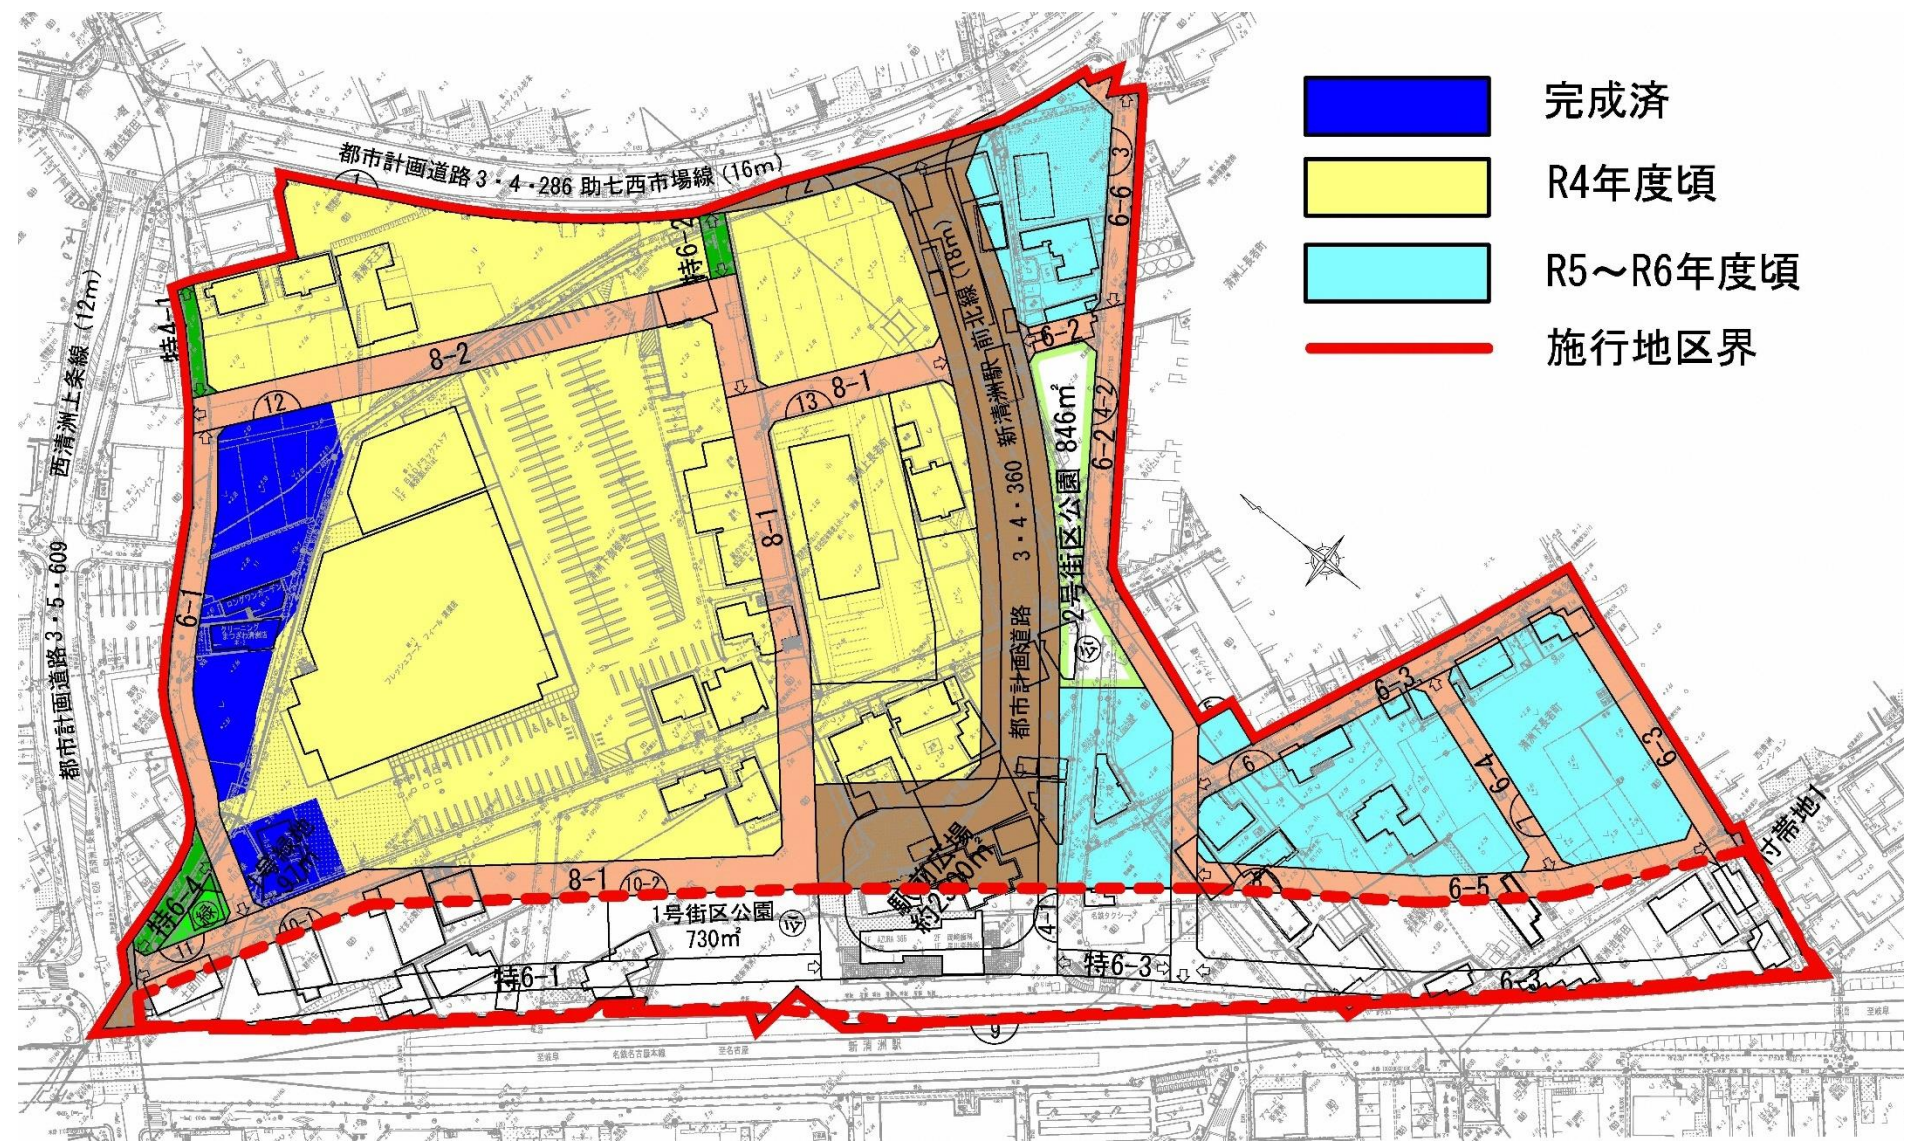

道路完成予定図

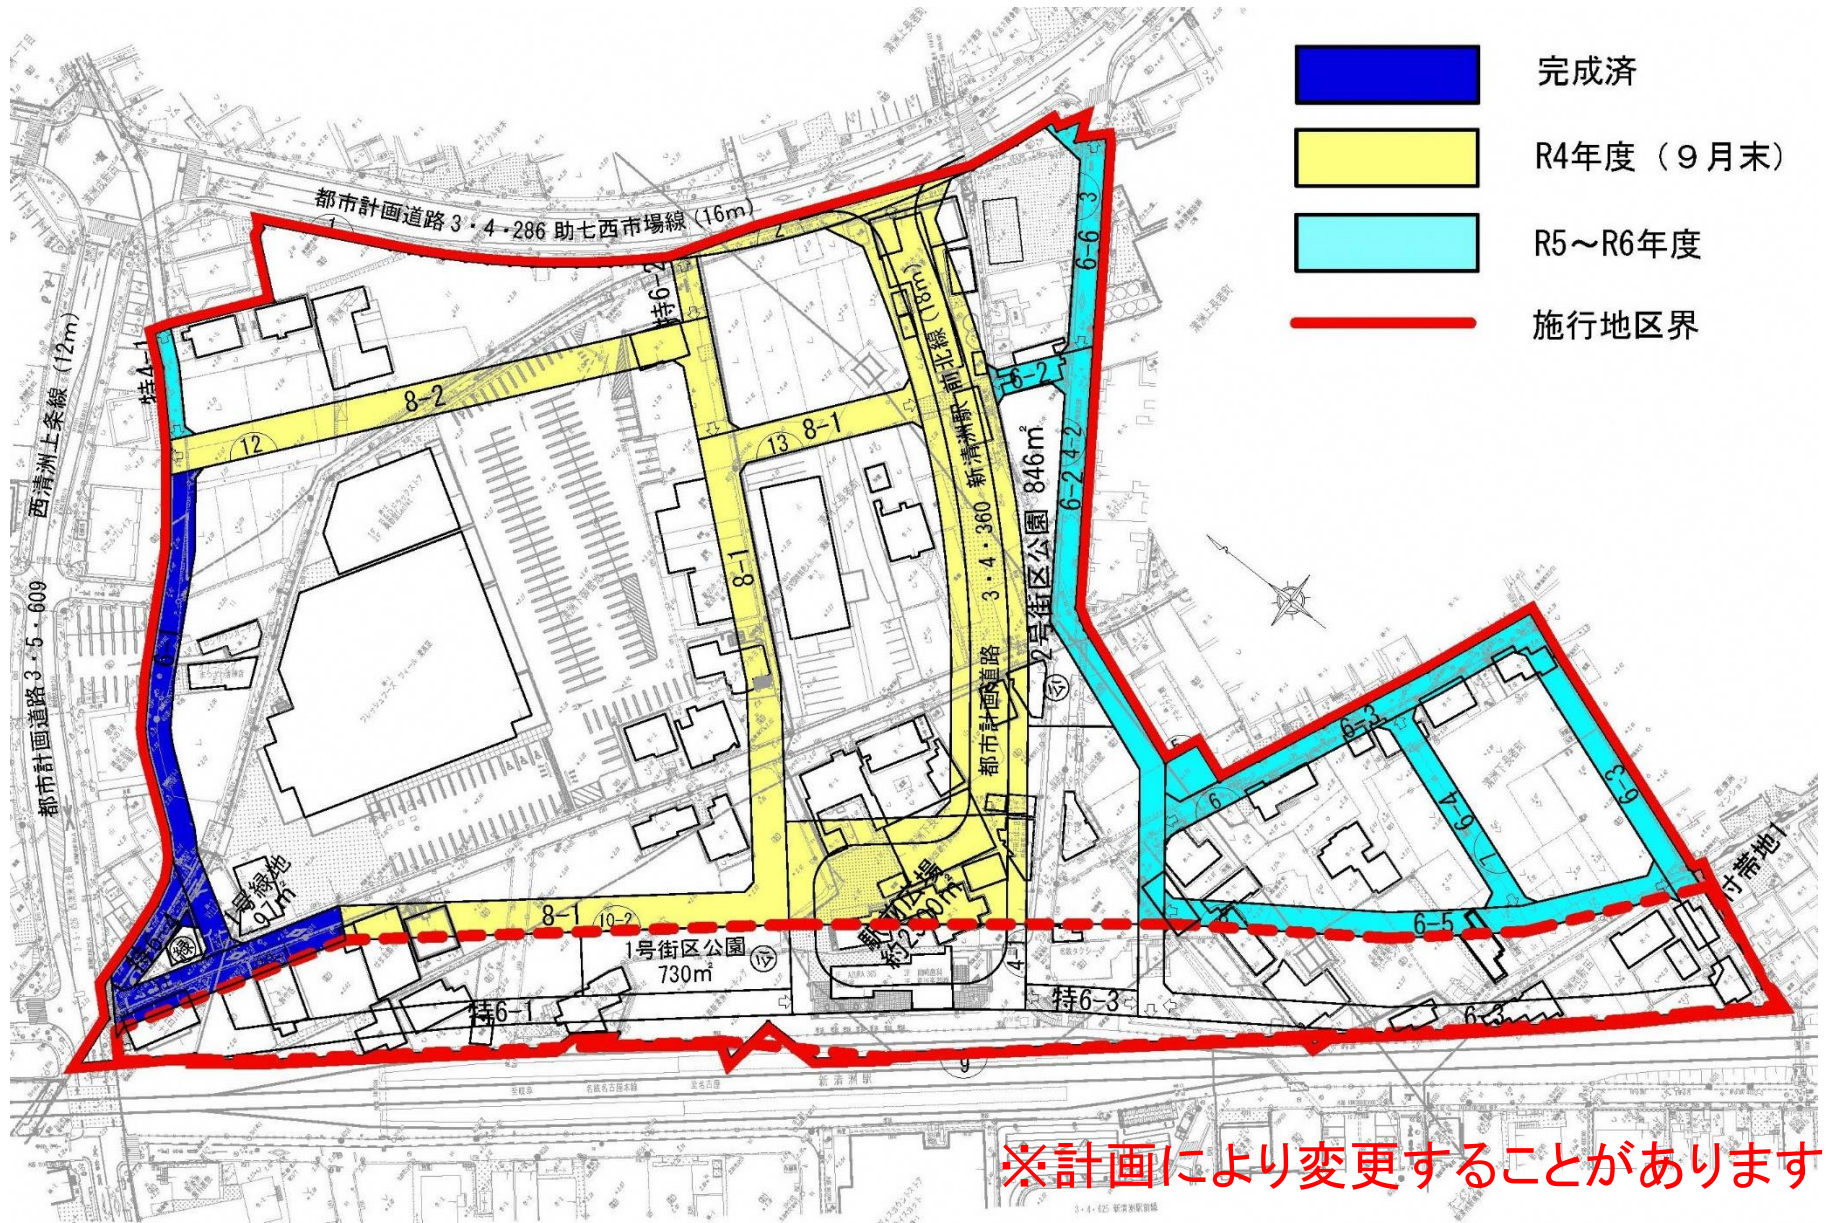

工事の進捗状況(8-1号線)

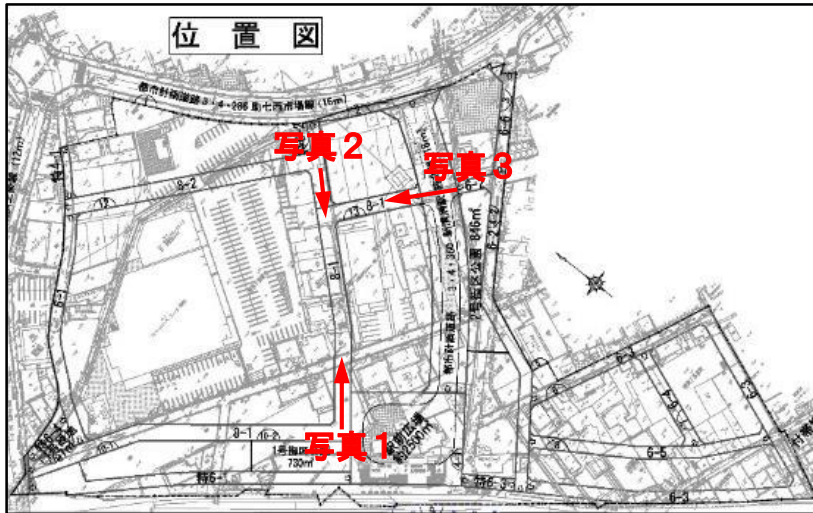


写真2 (完成した区8-1号道路)

写真3 (完成した区8-1号道路)

工事の進捗状況 (新清洲駅前北線・駅前広場)

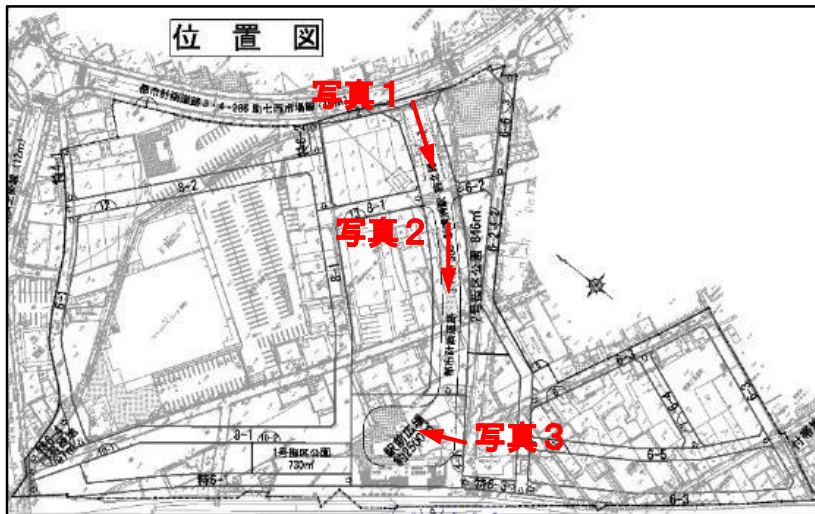


写真2 (新清洲駅前北線の工事状況)



写真3 (駅前広場の工事状況)

新清洲駅前北線(駅前広場含む)の開通について

開通予定：令和4年9月30日(金) 10時


幅員構成等：**道路部** 18m(車道9m 自歩道3m×2 植栽帯1.5m×2)

事業主体：清須市(新清洲駅北土地区画整理事業)


(車道アスファルト舗装 歩道部 ILB舗装)

駅前広場部 1. 180㎡(バス：一般車1台 タクシー1台、身障者1台)

10月1日(土)よりあしがるバス乗り入れ予定

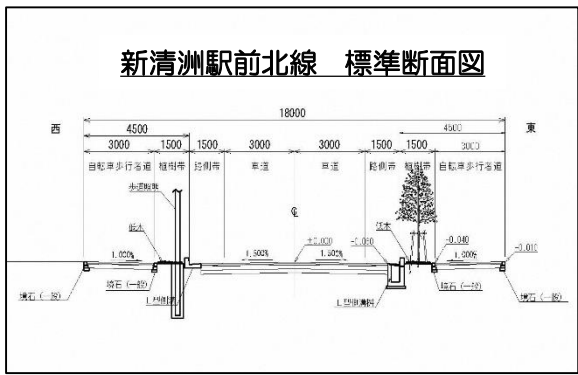

道路部

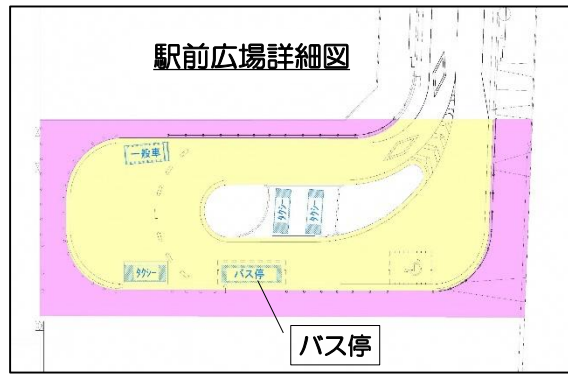


駅前広場部



(2) 仮換地指定について(第5回、第6回、 第7回使用収益開始)

使用収益開始箇所図

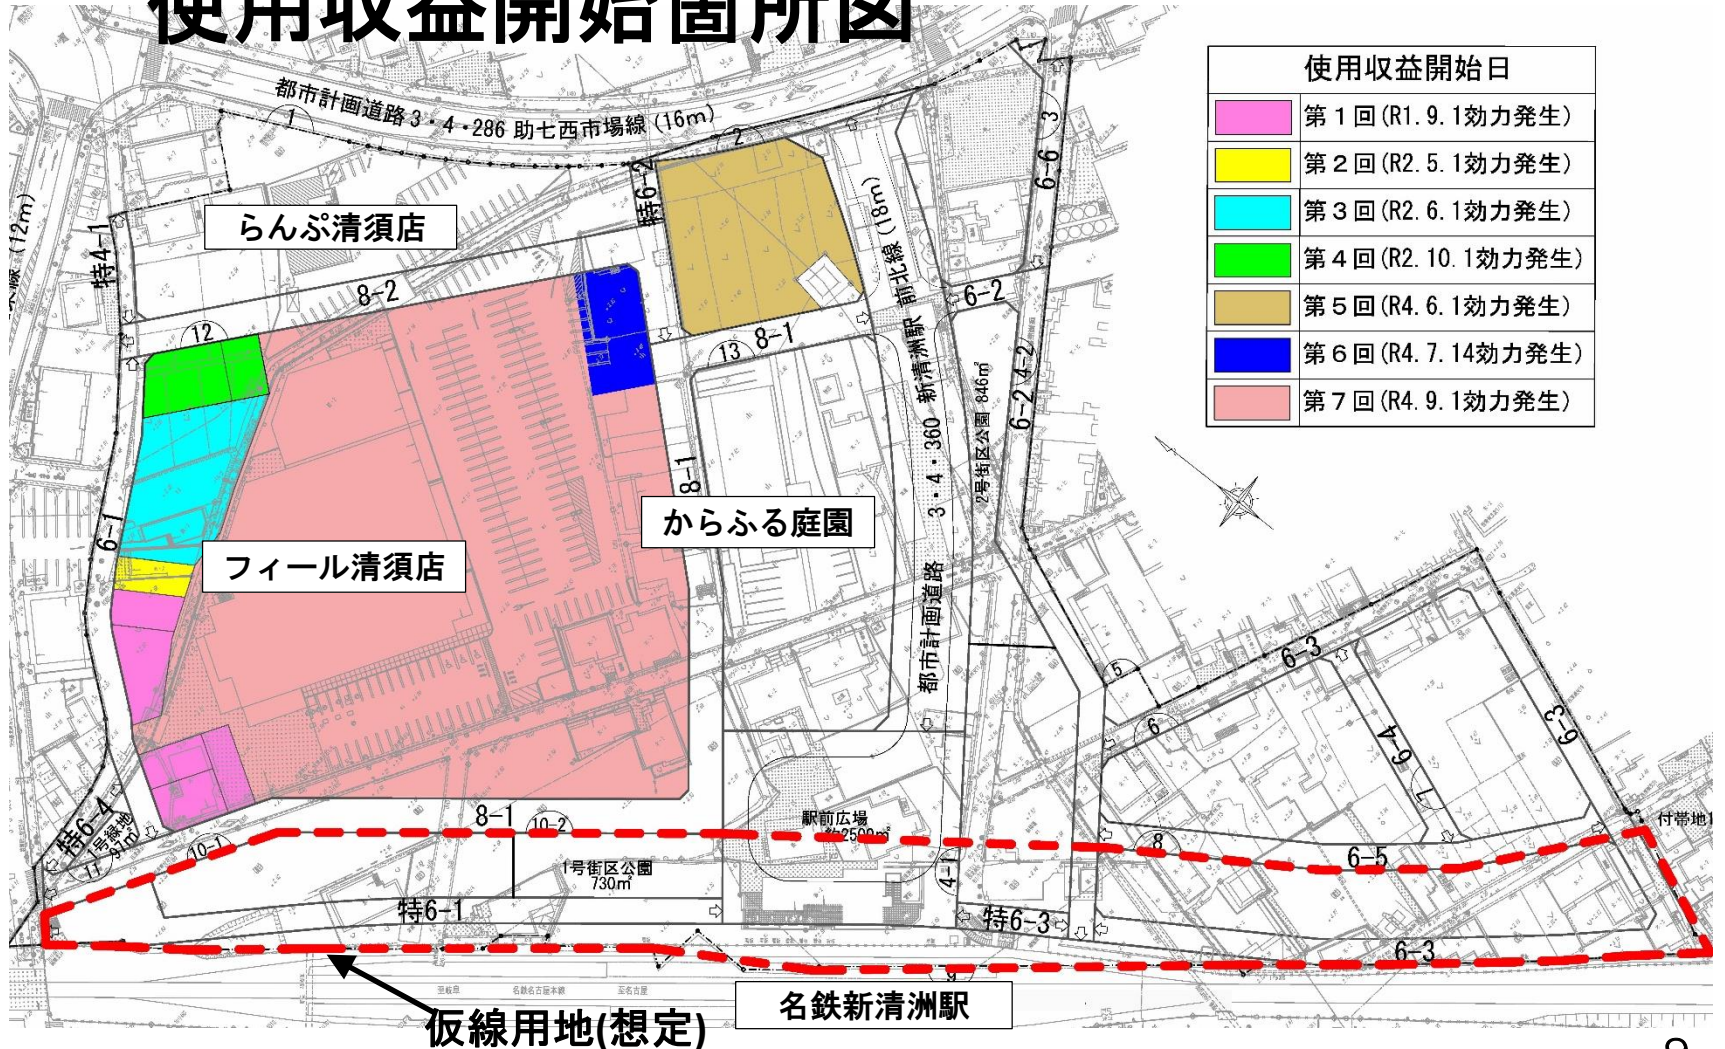


仮換地使用収益開始 総括表

区 分	仮 換 地		摘 要
	地 積 (m ²)	筆 数 (筆)	
全 地 区	34,759.40	135	
審議会報告済	2,198.71	9	第1回、第2回、第3回、 第4回使用収益開始
今 回 報 告	13,920.81	48	第5回、第6回、第7回 使用収益開始
合 計	16,119.52	57	
累計比 (%)	46.37%	42.22%	

(3) 令和4年度の工事概要について

令和4年度の工事概要

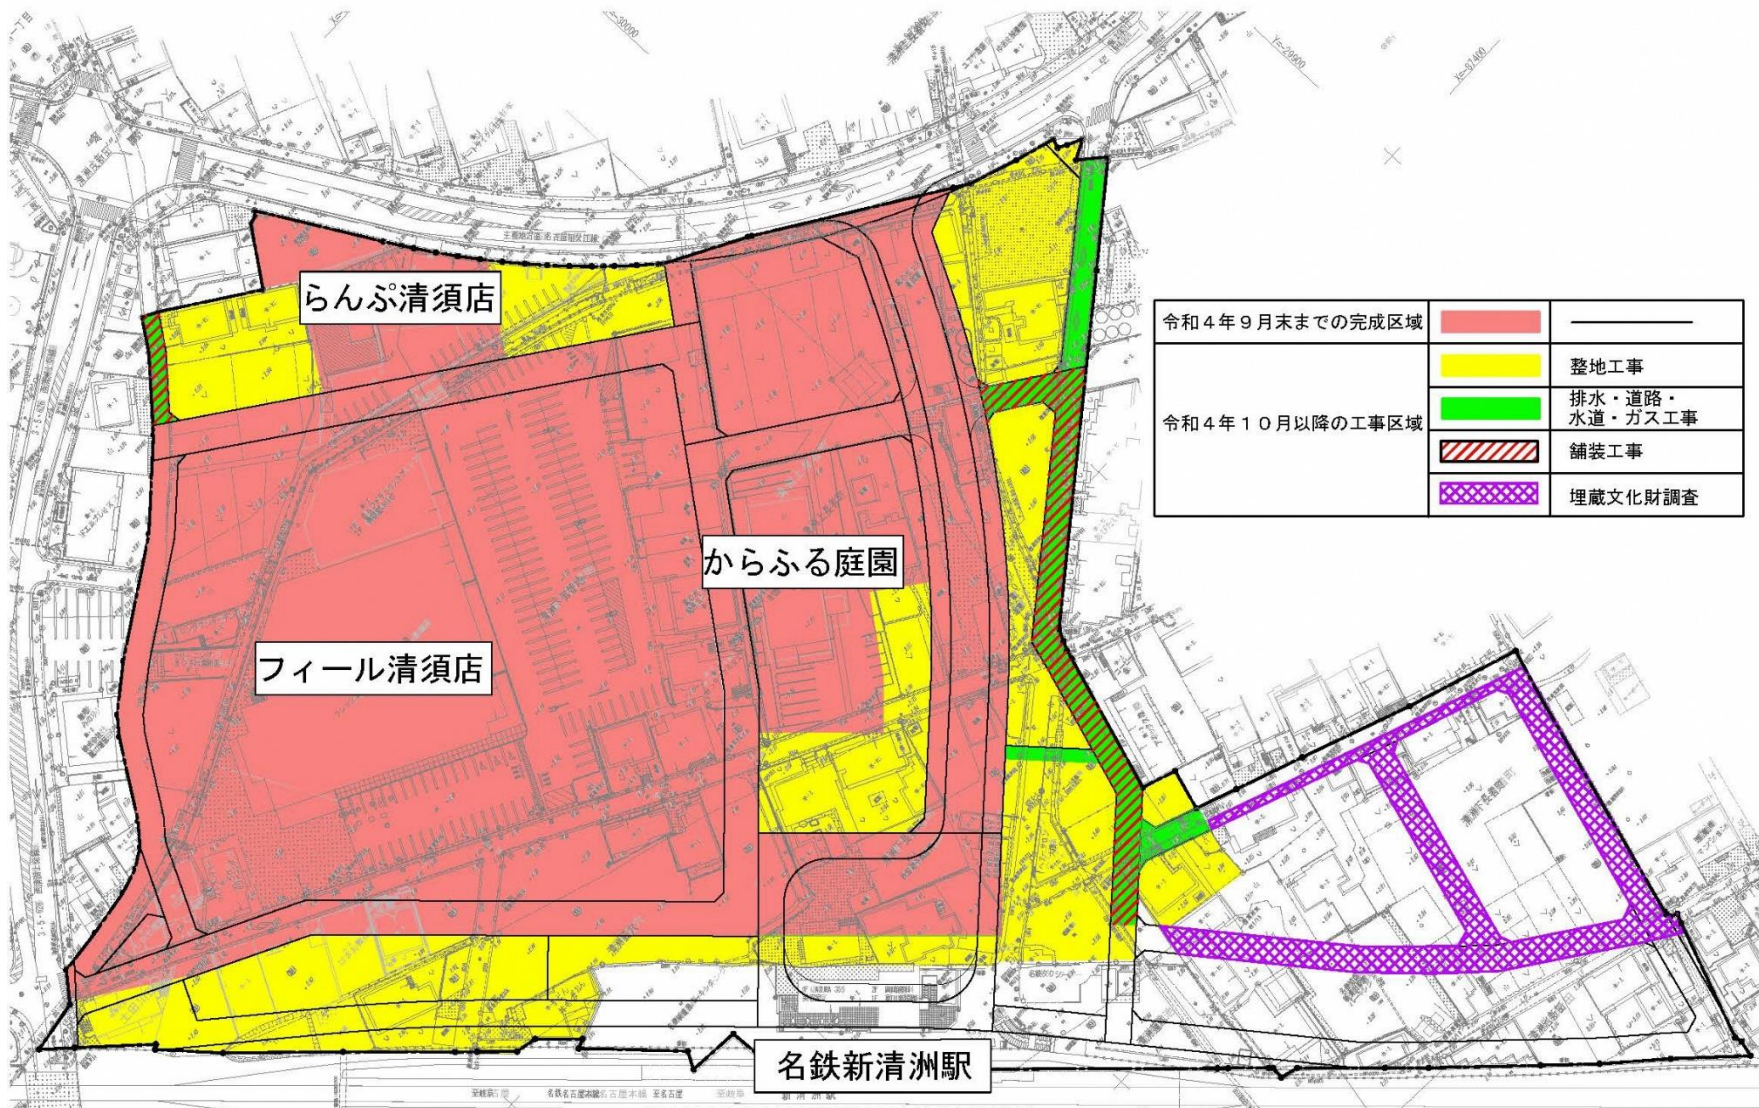

令和4年度工事で通行止を予定している箇所



令和5年度の工事概要

