


■ 清須市新学校給食センター整備工事の進捗状況について

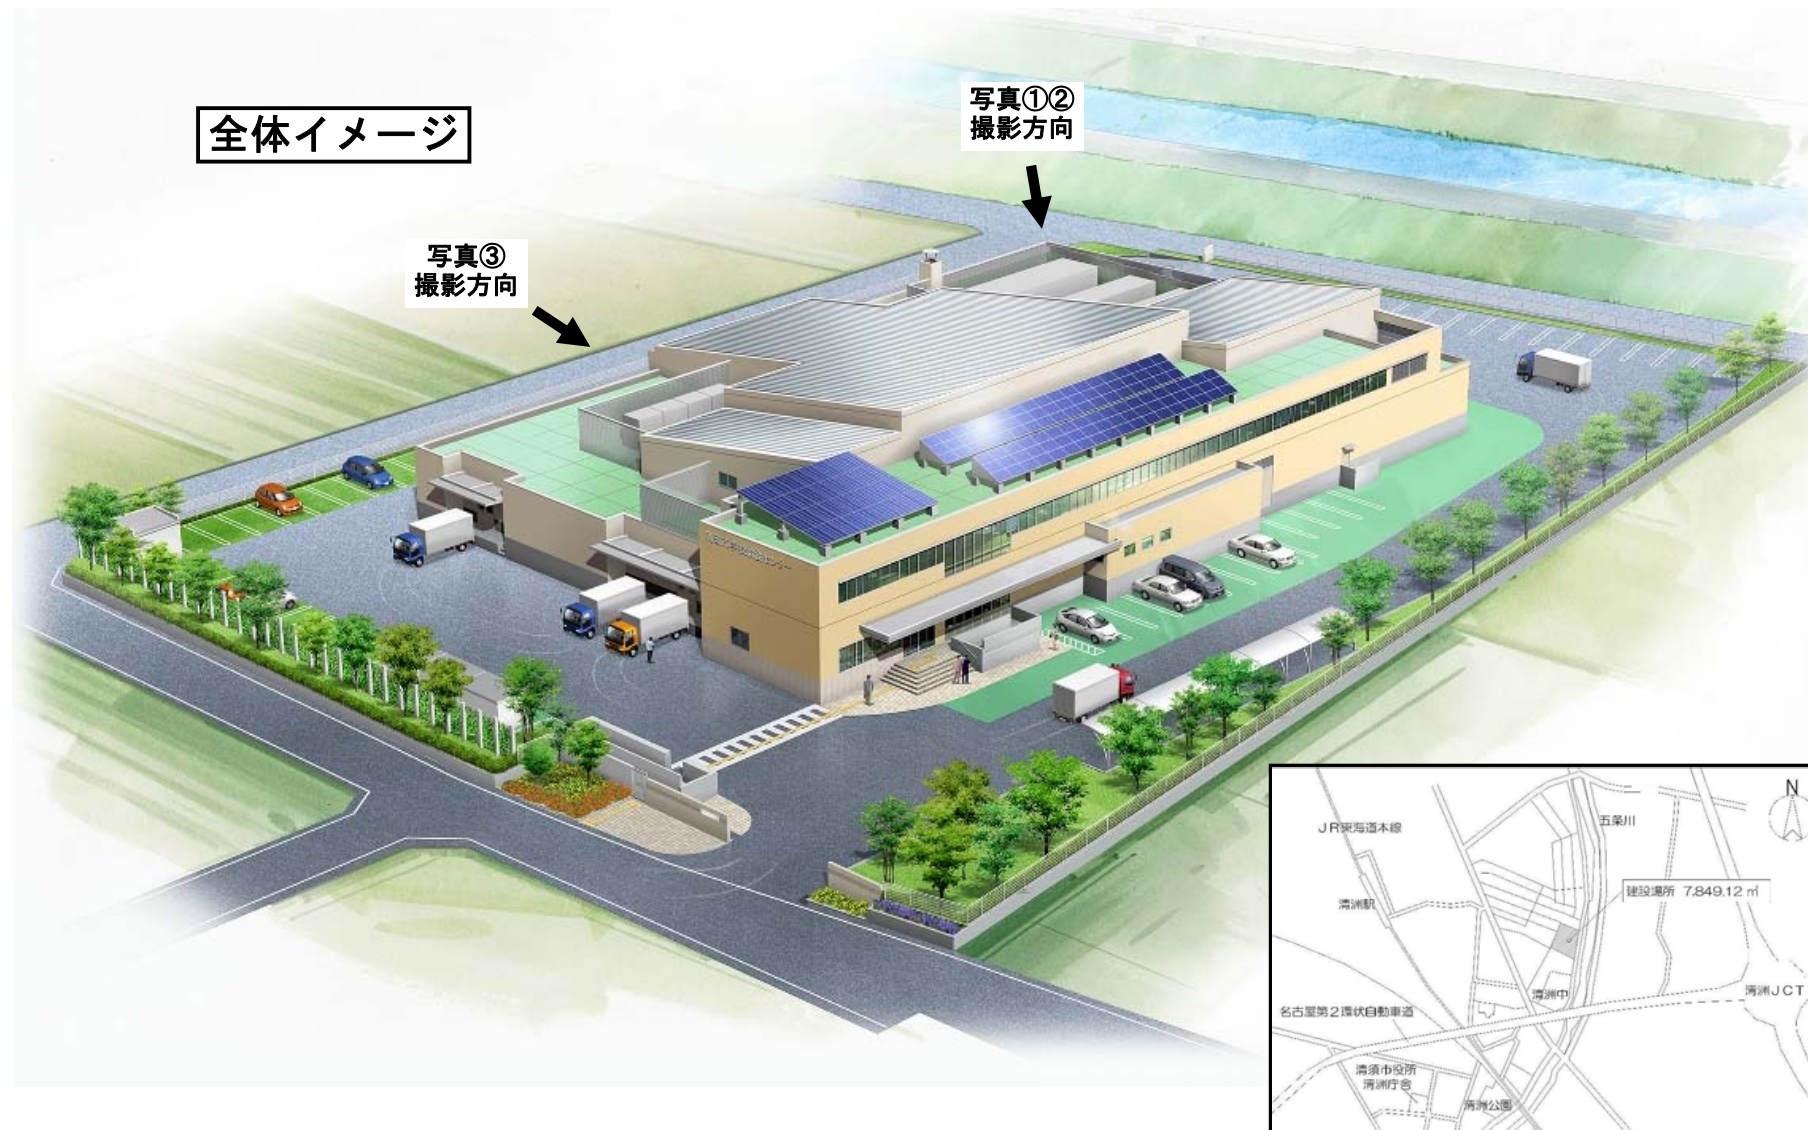

■ 新学校給食センター整備工事スケジュール

分類	内容	平成25年度												平成26年度				
		4~6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
建設工事	建築工事	準備工事		杭工事	基礎工事	外構工事	鉄骨工事	屋根工事	外装・内装工事	家具工事他	外構工事							
	電気・衛生・空調設備工事		施工図等作成		配管等工事	機器設置工事	受電接続											
	厨房排水除外設備工事			躯体工事		配管工事												
	太陽光発電設備工事		11月末時点進捗率 18%		基礎・架台工事	パネル設置工事												
厨房設備	厨房設備工事		施工図等作成	機器	機器製作	機器設置工事												
		入札・議決・契約										検査・調整	準備期間				2学期より給食開始	
