


■学校法人佑愛学園認定こども園開設の進捗状況について

1 認定こども園開設スケジュール

一場保育園の民営認定こども園化については関係先の調整を経て、本年度は次の事業に着手していきます。

◎平成30年度に清須市が行う事業

- ・仮設園舎の建設（建設中～11月上旬）
- ・仮設園舎での保育実施（11月上旬～）
- ・一場保育園の解体工事（11月上旬～翌1月末）

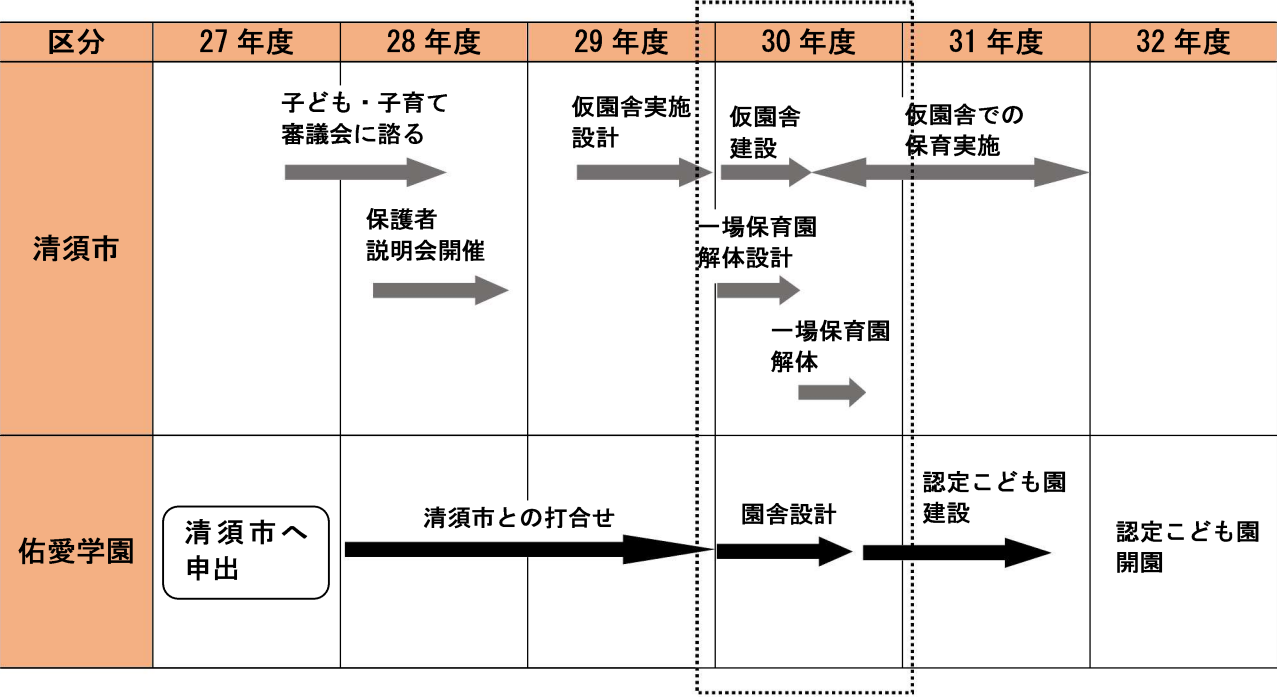

2 仮設園舎の建設及び仮設園舎での保育実施について

現一場保育園の解体及び認定こども園の建設の期間中は、近隣に建設中の仮設園舎にて、継続して保育を実施していきます。

（位置）一場566番地1ほか（敷地面積：1,533㎡）



（建物概要）軽量鉄骨2階建て（プレハブ工法）、延床面積約594㎡

部屋構成	階	保育室 (0・1歳)	保育室 (2歳)	保育室 (3歳)	保育室 (4歳)	保育室 (5歳)	遊戯室	調乳室	配膳室	入荷室 ワゴン室
	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2
	2	—	—	1	1	1	1	—	—	—
	階	乳児用 トイレ	幼児用 トイレ	沐浴 スペース	大人用 トイレ	職員室	保健室	更衣室 休憩室	教材室 倉庫	
	1	1	—	1	1	1	1	1	2	
その他設備	2	—	1	—	1	—	—	—	1	
	空調 保育室・遊戯室・職員室・配膳室					浄化槽	駐車場 5台	駐輪場 あり	給食荷受 あり	プール 組立式

（建設工事について）

工事期間：建設中～11月上旬

（仮設園舎での保育実施について）

現一場保育園の解体及び認定こども園の建設の期間中は、仮設園舎で保育を継続します。仮設園舎の建設が完了次第、引越を行い、仮設園舎での保育を開始します。

（11月上旬頃見込み）

＊仮設園舎での保育期間：平成30年11月上旬～平成32年3月31日

＊仮設園舎での保育終了後は、仮設園舎は取り壊し、現状復旧します。

3 一場保育園解体工事について

仮設園舎での保育開始後、現在的一场保育園園舎の解体工事を行います。

工事期間：平成30年11月上旬頃～平成31年1月末

4 説明会の開催について

今後、解体工事、仮設園舎での保育など近隣住民の方及び一場保育園在園保護者を対象とした説明会を開催します。また、説明会には学校法人佑愛学園様も出席いただき、認定こども園の建設工事及びこども園の概要等の説明も行います。

●在園保護者対象説明会

開催予定日：平成30年10月25日（木）

●地元説明会

開催予定日：平成30年10月27日（土）

5 認定こども園整備事業について

認定こども園の建設は、現在、学校法人佑愛学園が設計及び建設にかかる諸手続きを進めているところです。

認定こども園の建設は、現園舎解体工事後、平成31年2月から着手を予定しており、同年12月に完了、平成32年4月からの保育開始を目指しております。

（今後の予定）

・こども園建設工事入札：30年12月～31年2月（予定）

・こども園建設工事：31年2月～31年12月（予定）
